

Nyhedsbrev fra Frederikssund Kommunes Kyst-team

Kystbeskyttelsesprojekt ved Kignæs – status juni 2026

Kære grundejere

Frederikssund Kommune arbejder fortsat med kystbeskyttelsesprojektet ved Kignæs. Projektet har i første halvår af 2026 haft et lavere aktivitetsniveau end forventet som følge af midlertidigt personalefravær, men arbejdet med projektet fortsætter.

Hvad er der sket siden sidst?

Byrådet har i november 2025 besluttet at fremme projektet som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven. Det betyder, at kommunen formelt har igangsat arbejdet med at udarbejde et færdigt myndighedsprojekt, som skal danne grundlag for ansøgning om de nødvendige tilladelser til etablering af kystbeskyttelsen.

I kan læse referatet af byrådsmødet her:

https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Byraadets-moeder/2025-11-26_19-00/referat se sag nr. 185.

Skitseprojekt, og skitse til bidragsfordeling, m.m. kan findes på www.frederikssund.dk/kignaesdige

Byrådet har samtidig foreløbigt accepteret det forslag til bidragsfordeling, som kyst-teamet har udarbejdet. I det nuværende udkast fordeles udgifterne mellem Frederikssund Kommune, Novafos og de berørte grundejere efter følgende fordelingsnøgle:

- Frederikssund Kommune: 43 andele
- Novafos: 7 andele
- 12 grundejere: 4 andele per ejer

Den endelige bidragsfordeling fastlægges først i forbindelse med den videre behandling af projektet.

Næste skridt

Som vi også tidligere har drøftet med jer, kan vi konstatere at de gældende naturbeskyttelsesregler gør det udfordrende at finde en løsning, som både kan



indpasses hensigtsmæssigt i landskabet og samtidig holdes inden for en rimelig økonomisk ramme.

Frederikssund Kommune samarbejder derfor i øjeblikket med en miljøadvokat fra Codex Advokater, om at afdække mulighederne for at justere den nuværende projektskitse inden for lovgivningens rammer.

Når dette arbejde er afsluttet, vil vi anmode vores rådgiver, WSP, om at genoptage projekteringen. Det forventes at ske i august 2026. I den forbindelse vil WSP udarbejde en opdateret tidsplan for færdiggørelsen af myndighedsprojektet.

Hvornår bliver projektet færdigt?

På nuværende tidspunkt er tidsplanen fortsat forbundet med en del usikkerhed.

Hvis myndighedsprojektet kan færdiggøres ved udgangen af 2026, forventes de nødvendige tilladelser at kunne foreligge ca. 6 måneder senere. Tilladelserne vil dog kunne påklages, hvilket potentielt kan forlænge processen med yderligere 6 måneder.

Når tilladelserne er endelige, skal der udarbejdes et detailprojekt og udbudsmateriale, ligesom der skal oprettes et digelag. Erfaringer fra lignende projekter viser, at denne fase typisk tager omkring ét år.

Først herefter vil anlægsarbejdet kunne påbegyndes.

Det er vigtigt at understrege, at tidsplanen fortsat er behæftet med betydelig usikkerhed, og at ændringer i projektet eller myndighedsbehandlingen kan påvirke forløbet.

Hvad kommer løsningen til at koste?

I den seneste projektskitse er anlægsudgifterne anslået til ca. 5,6 mio. kr. Dertil anslår Frederikssund Kommune, at der skal tillægges 0,85 mio. kr. i projekteringsomkostninger.

Den endelige anlægsøkonomi afhænger blandt andet af resultatet af de kommende natur- og miljøundersøgelser samt af, om projektets udformning ændres væsentligt i forbindelse med den videre projektering.

Hvornår hører I mere?

Når WSP genoptager arbejdet med projektet, vil der blive udarbejdet en opdateret tidsplan.

Vi forventer at afholde et nyt borgermøde, når myndighedsprojektet er færdigudarbejdet og skal sendes i offentlig høring. Her vil der være mulighed for at få en gennemgang af projektet og stille spørgsmål og komme med kommentarer.


Indtil da er I altid velkomne til at kontakte Kyst-teamet på:

kystsikring@frederikssund.dk

Med venlig hilsen

Forventet tidslinje – de næste skridt

Tidsplanen er behæftet med stor usikkerhed og kan ændre sig undervejs.

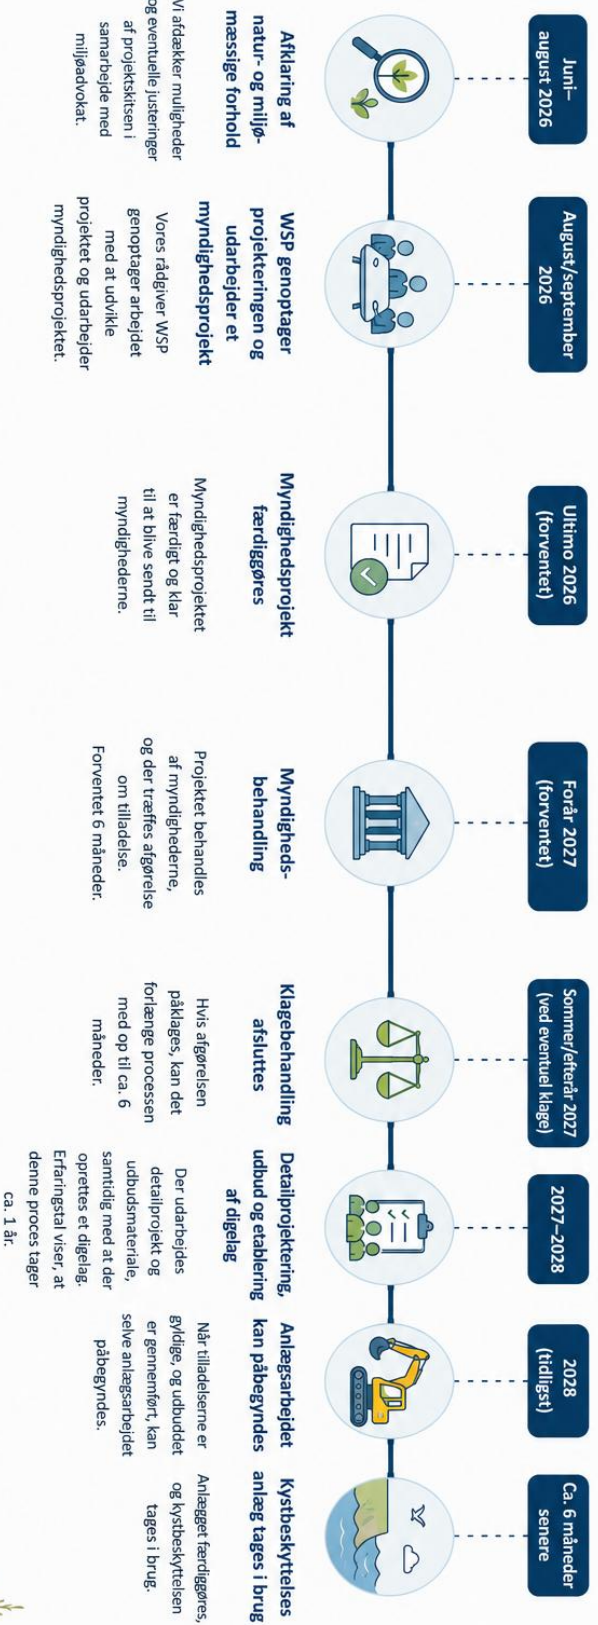

i Tidspunkterne er vejledende og baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Ændringer i projektet eller myndighedsbehandlingen kan påvirke tidsplanen.

